TRANSPORT STYRELSEN

Sjöfartsavdelningen

SE-klass - KOSTERVÅG (SLTA)

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.01.01	Bottenbesiktning	12	2025-05	UA					2026-05
10.02.01	Skrov utvändig okulärt	12	2025-05	UA					2026-05
10.03.01	Skrov tjockleksmätning	60	2025-05	UA					2030-05
10.04.01	Däck tjockleksmätning	60	2025-05	UA					2030-05
10.05.01	Skott tjockleksmätning	60	2025-05	UA					2030-05
10.06.01	Bottenventiler SB maskinrum	36	2024-05	UA					2027-05
10.06.02	Bottenventil BB maskinrum	36	2024-05	UA					2027-05
10.07.02	Överbord ventiler, över VL, FP övre 2st LÄNS	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.03	Överbord ventiler, över VL, Tank 1-3 SB,BB 6st LÄNS	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.04	Överbord ventiler, över VL, Tank 4 övre 2st LÄNS	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.05	Överbord ventiler, över VL, AP övre 2st LÄNS	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.06	Överbord ventiler, över VL, (växel, H.M, HjM) SB,BB	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.07	Överbord ventiler, över VL, maskinrum läns SB,BB	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.08	Överbord ventiler, över VL, Tank 3, SB -Toa	60	2025-08	UA					2030-08
10.07.09	Överbord ventiler, över VL, Nödläns SB,BB	60	2025-08	UA					2030-08
10.08.01	Skrov insida okulärt SB skroven	60	2022-03	UA					2027-03
10.08.02	Skrov insida okulärt BB skrov	60	2022-03	UA					2027-03

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.16.01	Roder lyft SB	60	2025-05				Acc		2030-05
10.16.02	Roder Lyft BB	60	2025-05				Acc		2030-05
10.17.01	Hjärtstock SB demonterad	60	2022-03	UA					2027-03
10.17.02	Hjärtstock BB demonterad	60	2022-03	UA					2027-03
10.18.01	Hjärtstock spel SB	12	2025-05	UA					2026-05
10.18.02	Hjärtstock spel BB	12	2025-05	UA					2026-05
10.19.01	Propelleraxel tätningar SB	12	2025-05	UA					2026-05
10.19.02	Propelleraxel tätningar BB	12	2025-05	UA					2026-05
10.20.01	Axeldragning SB propelleraxel	60	2022-03	UA				0	2027-03
10.20.02	Axeldragning BB propelleraxel	60	2022-03	UA				0	2027-03
10.21.01	Propelleraxel spel SB axel	12	2025-08	UA					2026-08
10.21.02	Propelleraxel spel BB axel	12	2025-08	UA					2026-08
10.21.03	Stödbock SB spel	12	2025-08	UA					2026-08
10.21.04	Stödbock BB spel	12	2025-08	UA					2026-08
10.22.03	Propellrar okulärbesiktigade SB	12	2025-08	UA					2026-08
10.22.04	Propellrar okulärbesiktigade BB	12	2025-08	UA					2026-08
10.24.01	Ankarkätting, okulärbesiktning	60	2022-03	UA					2027-03
10.24.02	Ankarwire, okulärbesiktigad	60	2022-03	UA					2027-03
10.25.01	Ankarkätting, wire kontroll mätt, infästning kontroll	60	2022-03	UA					2027-03
10.35.01	Ankarspel, funktionsprov	60	2022-06	UA					2027-06
10.35.04	Ankarspel, ingående besiktning	60	2022-03				Acc		2027-03
10.38.01	Styrmaskin, okulärbesiktning SB,BB	12	2025-08	UA					2026-08

10 SKROV

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
10.38.02	Styrmaskin, ingående besiktning SB	60	2022-03				Acc		2027-03
10.38.03	Styrmaskin, ingående besiktning BB	60	2022-03				Acc		2027-03
10.41.01	Dieseloljetank SB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.03	Dieseloljetank BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.04	Förpik övre SB,BB invändig besiktning	60	2022-03	UA					2027-03
10.41.05	Förpik undre SB,BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.06	Tank 1 SB,BB invändig besiktning	60	2022-03	UA					2027-03
10.41.07	Tank 2 SB,BB invändig besiktning	60	2022-03	UA					2027-03
10.41.08	Tank 3 SB,BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.09	Tank 4 övre SB,BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.10	Tank 4 undre SB,BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.11	DB maskin SB,BB invändig besiktning	60	2025-08			Egen			2030-08
10.41.12	Akterpik övre SB,BB invändig besiktning	60	2022-06	UA					2027-06
10.41.13	Akterpik undre SB,BB invändig besiktning	60	2025-08			Egen			2030-08
10.41.14	Batterirum SB, invändig besiktning	60	2022-03	UA					2027-03
10.41.15	Batterirum BB, invändig besiktning	60	2022-03	UA					2027-03

11 MASKINERI

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
11.01.01	Anordningar för drift med obemannat maskinrum	24	2024-05			Egen			2026-05
11.01.02	Högnivåalarm FP övre SB,BB	24	2024-05				Acc		2026-05
11.01.03	Högnivåalarm Tank 1-3 SB,BB	24	2024-05	UA					2026-05

11 MASKINERI

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
11.01.04	Högnivåalarm Tank 4 övre SB,BB	24	2024-05	UA					2026-05
11.01.05	Högnivåalarm AP övre SB,BB	24	2024-05			Egen			2026-05
11.01.06	Högnivåalarm Maskinrum övre SB,BB	24	2024-05	UA					2026-05
11.02.01	HM SB undersökt av auktoriserad	60	2021-02	UA				0	2026-02
11.02.02	HM BB undersökt av auktoriserad	60	2021-02	UA				0	2026-02
11.11.01	HM: SB trycklager, Vinkelväxel ingående besiktning	60	2020-10			Egen			2025-10
11.11.02	HM: BB trycklager, Vinkelväxel ingående besiktning	60	2020-10			Egen			2025-10
11.12.01	HM: SB kardanaxel inkl. sprängskydd, kontrollerad	60	2021-02			Egen			2026-02
11.12.02	HM: BB kardanaxel inkl. sprängskydd, kontrollerad	60	2021-02			Egen			2026-02
11.29.01	Hydrofor undersökt	60	2021-02			Egen			2026-02
11.31.01	Diff. tryckgivare i batteriventilation, SB (6 mån kont)	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.02	Diff. tryckgivare i batteriventilation, Bb (6 mån kont)	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.03	Batteri, Strängtemperatur	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.04	Batterirum temperatur	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.05	Batteriventilation 2st luftspjäll Sb & Bb	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.07	Batterirum funktionsprov batterirumsventilation Sb & Bb	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.08	Batteri ventilationskanal, gassensor Sb	6	2024-05			Egen			2024-11
11.31.09	Batteri ventilationskanal, gassensor Bb	6	2024-05			Egen			2024-11
11.31.10	Nödstopp framdrift samt huvudbrytare Sb & Bb	12	2024-05			Egen			2025-05
11.31.11	Kylvattensystem converter söt & sjöv. Sb & Bb	12	2024-05			Egen			2025-05
11.33.01	Meg-test hela anläggningen	60	2020-10	UA					2025-10
11.34.01	Brandpump SB ponton testad	60	2022-06	UA					2027-06

11 MASKINERI

Id	Beteckning	Frekv	Bes.datum	UA	Anm	Egen kont	Acc	Gångtim/spel	Nästa bes.
11.34.02	Brandpump BB ponton testad	60	2022-06	UA					2027-06
11.35.01	Bäddbultar, mellanlägg och motorbädd kontrolleras SB	60	2020-04				Acc		2025-04
11.35.02	Växel bäddbultar, mellanlägg och bädd kontrolleras SB	60	2020-04				Acc		2025-04
11.35.03	Bäddbultar, mellanlägg och motorfästen kontrollerad BB	60	2020-04				Acc		2025-04
11.35.04	Växel bäddbultar, mellanlägg och bädd kontrolleras BB	60	2020-04				Acc		2025-04
11.37.01	HjM SB: undersökt av auktoriserad firma	60	2020-05	UA				0	2025-05
11.37.02	HjM: BB undersökt av auktoriserad firma	60	2020-05	UA				0	2025-05
11.38.01	Hjm: SB generator undersökt	60	2020-05			Egen		0	2025-05
11.38.02	Hjm: BB generator undersökt	60	2020-05			Egen		0	2025-05

Kommentar

		Bes.datum
10.01.01	DNV-Liervik Norge	2003-05
10.01.01	DNV- Leirvik Norge	2005-02
10.01.01	Leirvik, Norge	2010-03
10.01.01	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.01.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.01.01	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.01.01	Utförd av DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp	2017-02
10.01.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.01.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.01.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03

10.01.01	Torrsatt Djupvik 2022-12-06	2022-12
10.01.01	Torrsatt Oma Slipp Norge. DNV utförst bottenbesiktning/DJ	2025-05
10.02.01	Se ovan.	2004-06
10.02.01	Se ovan	2005-02
10.02.01	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.02.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.02.01	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.02.01	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp. Fartyget skadat Sb förskepp vid vattenlinjen (i den del av stäven som förlänger vattenlinjen "Spetsen"). DNV´s rapport skada åtgärd, UA Skrov utv , UA	2017-02
10.02.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.02.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.02.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.03.01	Utförd av OMA Baatbyggeri mot tillverkningsritningar.	2020-04
10.03.01	Origo test&inspection AS utfört tjockleksmätning 13/5 2025, UA	2025-05
10.06.01	Se 1.1	2005-02
10.06.01	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.06.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.06.01	Utfört OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.06.01	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.06.01	Utförd 2016-12-09 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2017-02
10.06.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.06.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.06.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03

10.06.02	Se 1.1	2005-02
10.06.02	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.06.02	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.06.02	Utfört OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.06.02	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.06.02	Utförd 2016-12-09 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2017-02
10.06.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.06.02	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.06.02	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.07.02	Se 1.1	2005-02
10.07.02	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.02	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.03	Se 1.1	2005-02
10.07.03	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.03	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.04	Se 1.1	2005-02
10.07.04	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.04	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.05	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.05	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.06	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.06	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.07	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04

10.07.07	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.08	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.08	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.07.09	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.07.09	Utförd av DNV, Stord 2025-05-13, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2025-08
10.08.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.16.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.16.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor. Nytt roder monterat	2019-05
10.16.01	Ej lyft roder dock inspekterat, DNV rapport 2025-05-14	2025-05
10.16.02	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.16.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor. Nytt roder monterat	2019-05
10.16.02	Ej lyft roder dock inspekterat, DNV rapport 2025-05-14	2025-05
10.17.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.17.02	Ny tätning och lager, utfört OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.17.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.18.01	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.18.01	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.18.01	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp. Lager förnyat	2017-02
10.18.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.18.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.18.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.18.01	DNV kontrollerat spel	2025-05
10.18.02	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05

10.18.02	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp. lager förnyat	2017-02
10.18.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.r.	2019-05
10.18.02	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.18.02	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.18.02	DNV kontrollerat spel	2025-05
10.19.01	Nya Cutless monterade	2010-03
10.19.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.19.01	Ny tätning PSS monterad samt cutlesslager, utfört OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.19.01	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.19.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.19.01	Nya cutless och tätningar monterade Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.19.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.19.01	Nya axlar och lager 2022	2022-05
10.19.01	DNV kontrollerat UA	2025-05
10.19.02	Nya Cutless monterade	2010-03
10.19.02	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.19.02	Ny tätning PSS monterad samt cutlesslager, utfört OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.19.02	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.19.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.19.02	Nya cutless och tätningar monterade Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.19.02	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.19.02	Nya axlar och lager 2022	2022-05
10.19.02	DNV kontrollerat UA	2025-05

10.20.01	Ny propelleraxel monterade, OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.20.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor. Proppelleraxel hade pittings, accept till nästa dragning	2019-05
10.20.01	Nya axlar monterade vid konvertering till eldrift	2022-03
10.20.02	Ny propelleraxel monterade, OMA Slipp & Mek 2015-03	2015-03
10.20.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor. Proppelleraxel hade pittings accept till nästa dragning	2019-05
10.20.02	Nya axlar monterade vid konvertering till eldrift	2022-03
10.21.01	Bytt lager.	2004-06
10.21.01	Bytt lager	2011-03
10.21.01	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.21.01	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.21.01	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.21.01	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.21.01	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.21.01	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.21.01	Utförd av DNV, OMA Slipp, Stord 2021-03-02, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2021-03
10.21.02	Bytt lager.	2004-06
10.21.02	Bytt lager	2011-03
10.21.02	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.21.02	Utförd 2014-05-28 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2014-05
10.21.02	Utförd 2016-04-19 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2016-04
10.21.02	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.21.02	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.21.02	Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04

10.21.03	Bytt lager.	2004-06
10.21.03	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.21.03	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.21.04	Bytt lager.	2004-06
10.21.04	Utförd 2013-05-30 på Stord, Norge av DNV, Magnar Dahl Helland	2013-05
10.21.04	Utförd avMagnar Dah DNV, Stord 2016-12-09, på OMA Slipp.	2017-02
10.21.04	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2019-05
10.22.01	Kontroll och demont/ mont utfört av Hellseth AS 2015-03	2015-03
10.22.02	Kontroll och demont/ mont utfört av Hellseth AS 2015-03	2015-03
10.22.03	Utförd av DNV, Stord 2019-05-20, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2017-02
10.22.03	Proppellerblad BB, förnyade Utförd av DNV, Stord 2020-04-22, på OMA Slipp, Asbjörn Dahle, surveyor.	2020-04
10.22.03	Nya fasta propellrar monterade vid konvertering till eldrift	2022-05
10.22.04	Nya fasta propellrar monterade vid konvertering till eldrift	2022-05
10.24.02	Ny vajer monterad 2015-03, Westcon ankerståltau diam 16mm, 150m	2015-03
10.35.01	Wire är utbytt, ny 2015	2016-05
10.38.01	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp, Ompackning av kolvar	2019-05
10.38.02	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp, Ompackning av kolvar	2019-05
10.38.03	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp, Ompackning av kolvar	2019-05
10.41.03	Rederiet gjort invändig kontroll och rengöring 2019	2019-01
10.41.11	SB o. BB Rengöres	2010-03
10.41.11	Tjockleksmätning resultat, ingen korrosion	2025-08
10.41.14	Avsyn Swede Ships intygskontroll	2022-03
10.41.15	Avsyn Swede Ships intygskontroll	2022-03

11.01.01	Utförd av MOTORVÄST 2019-03,	2019-05
11.01.01	Konverterad till eldrift 2022. Utförd egenkontroll D.E april	2024-05
11.01.02	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp,	2019-05
11.01.03	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp,	2019-05
11.01.04	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp,	2019-05
11.01.05	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp,	2019-05
11.01.06	Utförd av Rederiet, Stord 2019-05, på OMA Slipp,	2019-05
11.02.01	Båda huvudmaskinerna utbytta till nya.	
11.02.01	Utfört Motor Väst, Scania 2021-02-17	2021-02
11.02.02	Se 11.2.1	
11.02.02	Utfört Motor Väst, Scania 2021-02-17	2021-02
11.31.01	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.31.03	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.31.04	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.31.08	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.31.09	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.31.11	Egenkontroll utförd april, DE	2024-05
11.33.01	utfört Elecon 2015-03	2015-03
11.35.01	Utfört av OMA Slipp & Mek. Verkstad A.S 2020-04-22	2020-04
11.35.02	Kontrollerade vid byte av växlar 2014	2014-05
11.35.03	Kontrollerade vid byte av HM 2015	2015-05
11.35.03	Utfört av OMA Slipp & Mek. Verkstad A.S 2020-04-22	2020-04
11.35.04	Kontrollerade vid byte av växlar 2014	2014-05

11.35.04	Utfört av OMA Slipp & Mek. Verkstad A.S 2020-04-22	2020-04
11.37.01	Utfört OMA Baatbyggeri	2020-05
11.37.02	Utfört OMA Baatbyggeri	2020-05

Propelleraxel

10.21.01 Propelleraxel spel SB axel

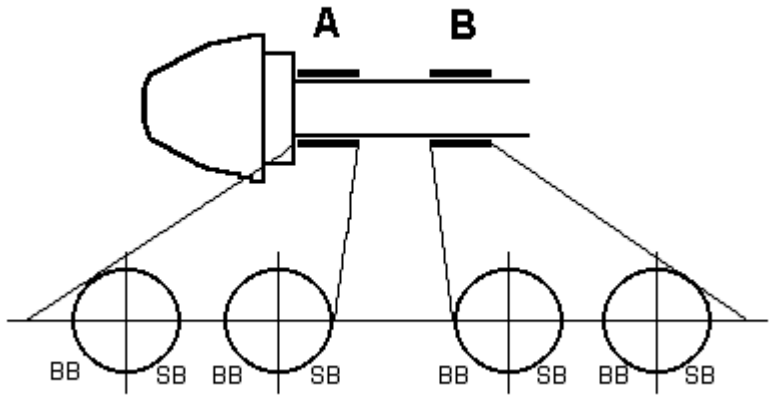

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2000-05		
2001-05	0,15	
2002-05	0,20	
2003-05	0,45	
2004-06	0,10	
2005-02	0,15	
2006-09		
2007-05	0,15	0,00
2008-03		
2009-03	0,35	0,00
2010-03	0,05	0,00
2011-03	0,05	0,00
2012-03	0,15	0,00
2013-05	0,30	0,00
2014-05	0,20	0,00
2015-03	0,10	0,10
2016-04		
2017-02	0,35	0,00

10.21.01 Propelleraxel spel SB axel

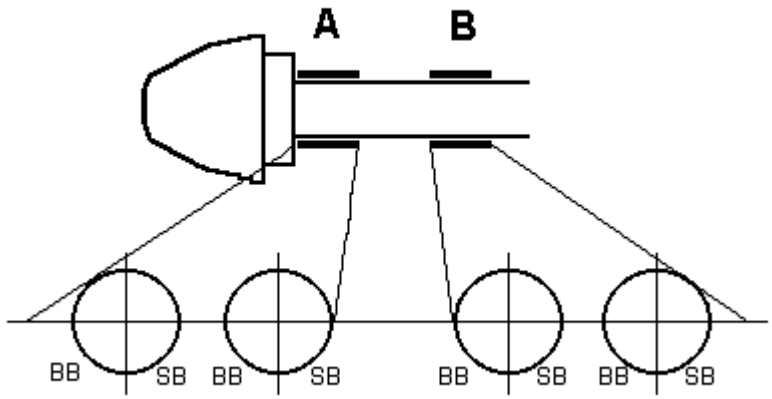

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2019-05	0,10	0,10
2020-04	0,15	0,00
2021-03	0,10	0,00
2022-05		
2022-12	0,10	0,00
2025-08	0,15	0,20

10.21.02 Propelleraxel spel BB axel

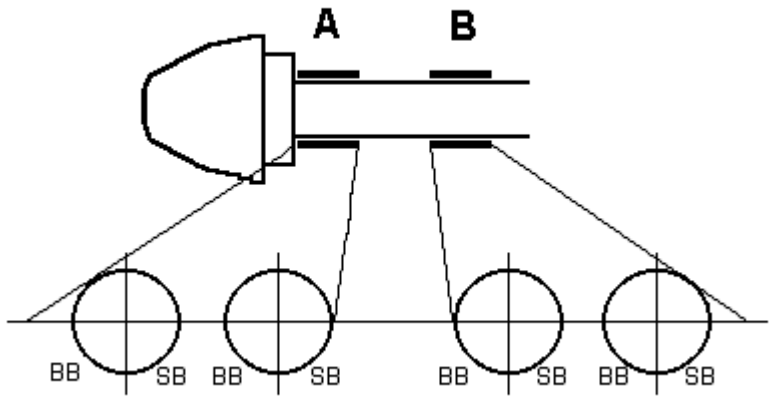

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2000-05		
2001-05	0,15	
2002-05	0,20	
2003-05	0,45	
2004-06	0,10	
2005-02	0,15	
2006-09		
2007-05	0,20	0,00
2008-03		
2009-03	0,35	0,00
2010-03	0,05	0,00
2011-03	0,05	0,00
2012-03	0,20	0,00
2013-05	0,25	0,00
2014-05	0,20	0,00
2015-03	0,10	0,10
2016-04		
2017-02		
2019-05	0,10	0,10
2020-04	0,15	0,00
2021-03	0,10	0,00

10.21.02 Propelleraxel spel BB axel

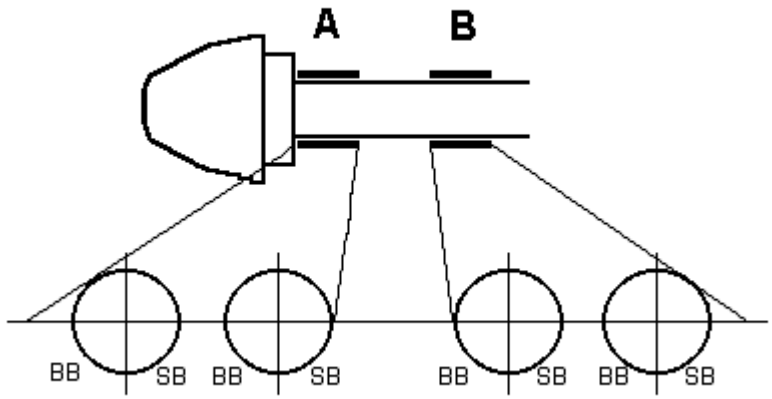

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2022-05		
2022-12	0,10	0,00
2025-08	0,25	0,20

10.21.03 Stödbock SB spel

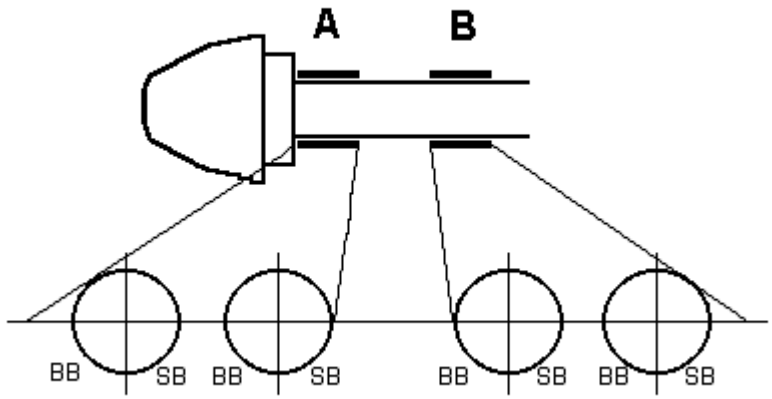

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2001-05		0,10
2002-05		0,15
2003-05		
2004-06		0,10
2005-02		0,10
2006-09		
2007-05	0,00	0,15
2008-03		
2009-03	0,00	0,25
2010-03	0,00	0,05
2011-03	0,00	0,05
2012-03	0,05	0,00
2013-05	0,00	0,20
2014-05	0,00	0,20
2015-03	0,00	0,10
2016-04	0,00	0,15
2017-02	0,00	0,35
2019-05	0,00	0,10
2020-04	0,00	0,20
2021-03	0,00	0,10
2022-05		

10.21.03 Stödbock SB spel

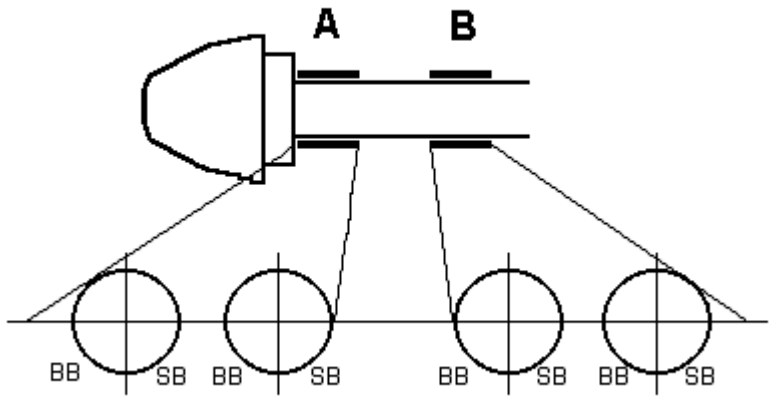

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2022-12	0,00	0,10
2025-08	0,00	0,20

10.21.04 Stödbock BB spel

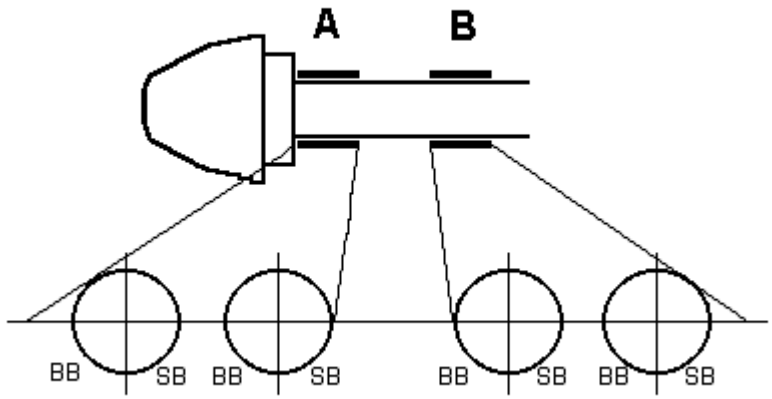

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2001-05		0,10
2002-05		0,15
2003-05		0,45
2004-06		0,10
2005-02		
2006-09		
2007-05	0,00	0,20
2008-03		
2009-03	0,00	0,25
2010-03	0,00	0,05
2011-03	0,00	0,05
2012-03	0,05	0,00
2013-05	0,00	0,25
2014-05	0,00	0,25
2015-03	0,00	0,10
2016-04	0,00	0,20
2017-02	0,00	0,30
2019-05	0,00	0,10
2020-04	0,00	0,20
2021-03	0,00	0,20
2022-05		

10.21.04 Stödbock BB spel

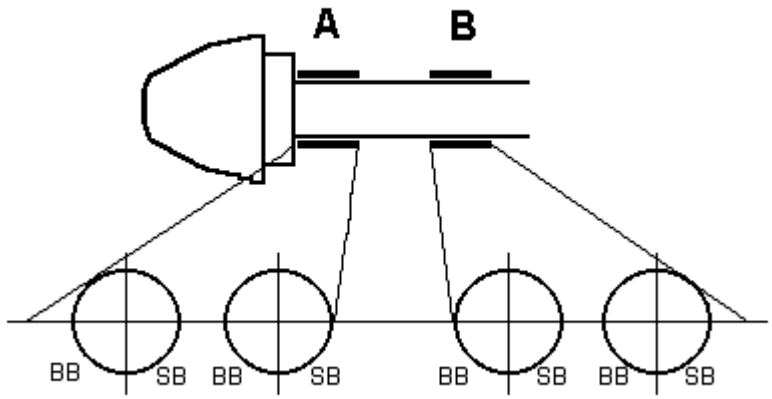

Bes.datum	A Yttre lager	B Inre lager
2022-12	0,00	0,10
2025-08	0,00	0,15

Roder

10.18.01 Hjärtstock spel SB

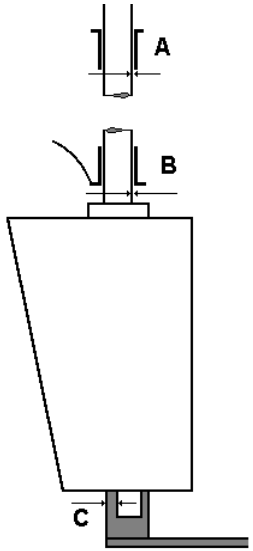

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2000-05						
2001-05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2002-05			0,05			
2010-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2011-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2012-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2013-05	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2014-05	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2015-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2016-04	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2017-02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2019-05	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2020-04	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2021-03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2022-12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2025-05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00

10.18.01 Hjärtstock spel SB-Cutless

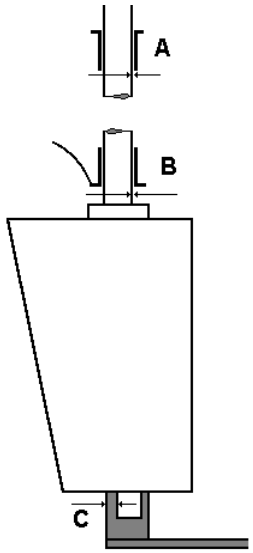

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2003-05			0,25			
2004-06			0,20			
2005-02			0,20			
2006-09						
2007-05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
2008-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2009-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

10.18.02 Hjärtstock spel BB

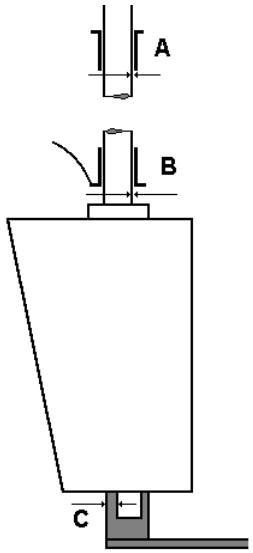

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2000-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-05			0,05			
2002-05			0,05			
2010-03						
2011-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2012-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2013-05	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2014-05	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2015-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2016-04	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2017-02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2019-05	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2020-04	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2021-03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2022-12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2025-05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00

10.18.02 Hjärtstock spel BB-Cutless

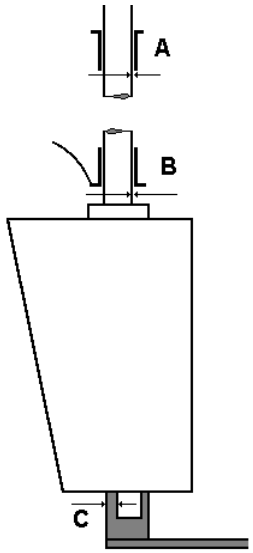

	Hjärtstocklager				Skädda	
	A		B		C	
Bes.datum	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB	För-Akter	SB-BB
2003-05			0,20			
2004-06			0,15			
2005-02			0,20			
2006-09						
2007-05	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2008-03						
2009-03	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
